

PROPOSTA DE EXECUÇÃO

Ciclo 1 — Escopo e cronograma

Migração MaxiPago para Gateway Braspag e Cartão Protegido

OBJETIVO DO DOCUMENTO

Definir o que será entregue, as responsabilidades e a sequência de execução para preservar as cobranças de doações durante a transição.

ChildFund Brasil | AP-74930-W0D3


Data de referência: 10/09/2026 | Corte informado: 15/10/2026



ARQUITETURA DE CONVIVÊNCIA

Visão do Ciclo 1

Duas plataformas no mesmo ambiente com roteamento e rollback controlados

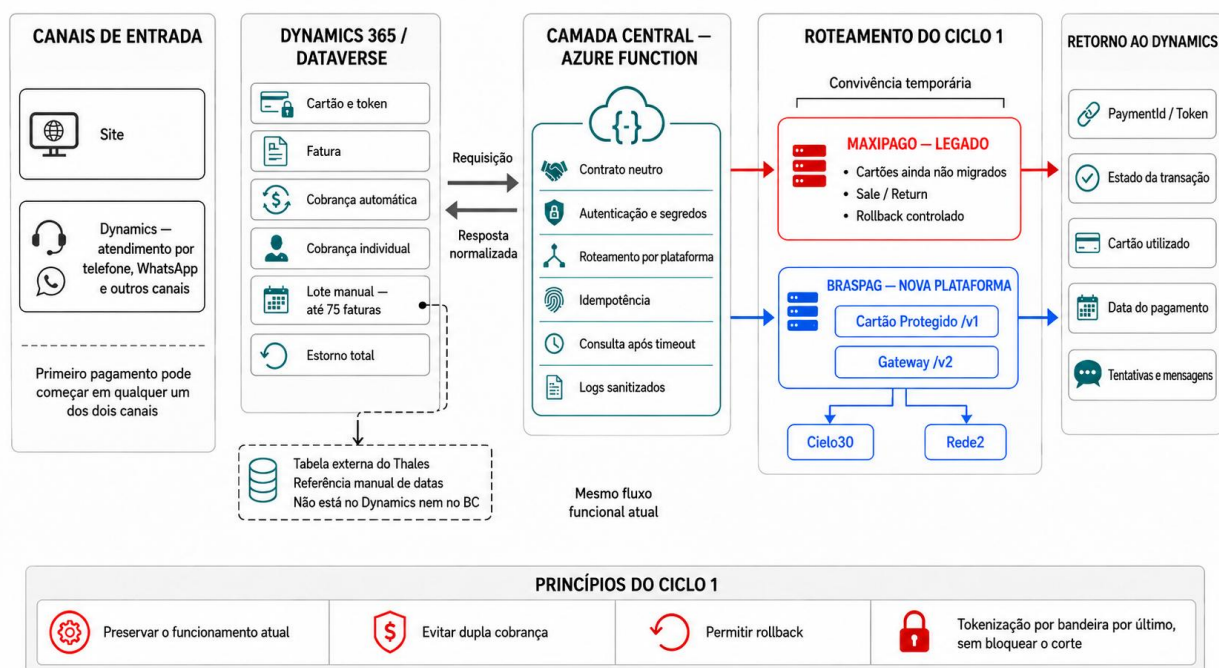

Fluxo do Ciclo 1 — convivência temporária entre MaxiPago e Braspag.

Princípio da entrega

Primeiro reproduzir o funcionamento essencial de produção. Melhorias estruturais adicionais ficam para ciclos posteriores; a tokenização por bandeira é uma etapa final condicionada e não bloqueia o corte básico.

CICLO 1

1. Objetivo da entrega

Entregar equivalência do processo produtivo atual de cartões na nova plataforma, com Cielo30 e Rede2, mantendo MaxiPago disponível durante a transição. A entrega deve preservar cobrança automática, individual, lote manual e estorno total, centralizar a comunicação externa em Azure Function e permitir rollback controlado.

A homologação funcional é responsabilidade da ChildFund. O cronograma contempla construção, testes técnicos, correções da implementação e apoio técnico ao corte, enquanto a execução e a aprovação dos testes funcionais permanecem sob responsabilidade do cliente.

CICLO 1

2. Premissas do cronograma

- O código e os componentes já mapeados permanecem como base do desenvolvimento.
- O Ciclo 1 continua síncrono e sem Service Bus.
- O lote continuará sendo selecionado manualmente, com limite operacional de 75 registros.
- O Gateway Braspag /v2 e o Cartão Protegido /v1 serão as APIs adotadas.
- Cielo30 e Rede2 estarão contratados e habilitados nos ambientes necessários.
- A ChildFund/Braspag fornecerá credenciais, tokens de teste, casos sandbox e retorno da portabilidade em tempo hábil.
- Serão criados inicialmente quatro campos neutros; eventual quinto campo só será incluído após a prova técnica.
- A tabela de datas de processamento/reprocessamento é externa ao Dynamics e ao BC, mantida manualmente pelo Thales como referência para a seleção manual; ela continuará assim no Ciclo 1.
- O primeiro pagamento poderá ter origem no site ou no atendimento assistido pelo Dynamics. O cadastro de cartão e a cobrança no Dynamics permanecem operações separadas.
- O termo débito usado pela ChildFund corresponde a débito em conta, com dados mantidos nos campos de conta de débito do cadastro do doador. Não se trata de cartão de débito e não existe chamada à MaxiPago nesse processo; portanto, débito em conta não integra esta migração.
- Estorno será integral, como no escopo inicial.
- Tokenização por bandeira é uma etapa final opcional do ciclo e não bloqueia o corte básico.
- A execução está planejada entre 14/09/2026 e 15/10/2026, com atividades técnicas sobrepostas quando houver independência entre elas.

2.1 Evidências operacionais confirmadas

Calendário manual de processamento e reproprocessamento

Thales Freire
Para **Thales Freire**

Acompanhar. Data de conclusão: segunda-feira, 23 de setembro de 2024.

Vencimento cartão	Dia Processar	Dia Reprocessar 1x	Dia Reprocessar 2x
21 a 26	1	2	
27 a 31	5	6	
01 a 5	10	11	12
6 a 10	15	16	17
11 a 16	20	21	22
17 a 20		26	27

Essa tabela é mantida manualmente pelo Thales fora do Dynamics e do Business Central. Ela orienta a montagem do filtro e a seleção das faturas que serão processadas em lote. O Ciclo 1 preserva esse procedimento, inclusive o limite operacional de até 75 faturas por seleção, sem automatizar ou recriar a tabela.

Referência da fatura no portal MaxiPago

portal.maxipago.net/vpos/VPOS

Relatório de Pagamentos

Busca avançada:

Componente de venda/NDU: Meio de pagamento:

Cod Autoração: Adquirente:

TID Adquirente: ID do Cliente:

Email:

Ceção: 4 primeiros números: 4 últimos números: Voto:

Mostrar dados:

☐ Hoje ☐ Ontem ☐ Esta semana ☐ Este mês ☐ De até

Relatório:

Período:

Gerar relatório

Cliente	ID do Pedido	ID da Transação	Descrição	Meio de Pagamento	Status	Valor	Pagado	Número de Referência	Ações
0	0AO11508-01A05846782-5F13-2D0C85A3	130233164	Venda Direta (Vista) ...8621	Negativa	R\$300.00	1		K711	
	0AO11593-01A05946F0995-C237-235E888E	130219292	Venda Direta (Eli) ...0714	Negativa	R\$300.00	1		4710	
duardo	0AO11596-01A05946C0D1-8074-3841F0E	1329750675	Venda Direta (Vista) ...5104	Capturada	R\$800.00			INV-803882-CZY1M3	
	0AO11593-01A05946E01A-724D-42D9935A	1329750676	Venda Direta (Mastercard) ...0003	Capturada	R\$800.00			INV-803881-V6X6N9	
la	0AO115AF-01A05946C4F7-75EF-1C86D648	1329750678	Venda Direta (Mastercard) ...5034	Capturada	R\$800.00			INV-803879-FY3H96	
	0AO115AF-01A05946C676-AE88-2A72E9FE	1329750633	Venda Direta (Mastercard) ...5294	Negativa	R\$800.00			INV-803876-23M8Y0	
	0AO11593-01A059463BB-8E08-03C45A81	1329750617	Venda Direta (Eli) ...7446	Negativa	R\$800.00			INV-803875-11P304	
	0AO11208-01A05946C192-E0D0-3C024EE	1329750605	Venda Direta (Mastercard) ...0492	Capturada	R\$800.00			INV-803877-04B3R4	
	0AO11588-01A05946C192-1269-01537328	1329750607	Venda Direta (Vista) ...6303	Capturada	R\$800.00			INV-803876-H8X3K2	
	0AO11596-01A059468986-9CC3-448CA2A3	1329750584	Venda Direta (Mastercard) ...4258	Negativa	R\$800.00			INV-803870-07H223	
	0AO11588-01A059468442-8B30-7718791D	1329750523	Venda Direta (Mastercard) ...1576	Negativa	R\$800.00			INV-803872-V6K4793	
	0AO11592-01A059468466-0068-4AC82666	1329750526	Venda Direta (Mastercard) ...1243	Capturada	R\$800.00			INV-803874-3C7766	
	0AO11588-01A059468457-5961-30B91625	1329750525	Venda Direta (Vista) ...9440	Capturada	R\$800.00			INV-803869-0022D3	
	0AO11593-01A05946A554-3C43-61F978F8	1329750439	Venda Direta (Mastercard) ...4439	Capturada	R\$800.00			INV-803867-Q4Q3F5	
istina	0AO11508-01A05946A586-7128-SCA8B09	1329750441	Venda Direta (Mastercard) ...8084	Capturada	R\$600.00			INV-803871-T1R0D1	
0	0AO11593-01A058F8A72-3C44-40730706	1329644231	Venda Direta (Vista) ...1960	Capturada	R\$100.00	1		4709	
	0AO11593-01A0588A4CF-CD10-08719315	1329502292	Venda Direta (Mastercard) ...0261	Negativa	R\$800.00			INV-795032-X0K0159	

18 pedido(s) de 18 encontrado(s)

Pagamento que vem do site

Exportar para Excel (CSV)

A evidência mostra a coluna **Número de Referência** no portal MaxiPago. As cobranças relacionadas ao Dynamics aparecem no exemplo com referência INV- . . . , enquanto uma cobrança originada no site apresenta referência numérica. A nova integração deve preservar uma correlação inequívoca entre transação, fatura e canal de origem, sem depender apenas do formato visual da referência.

CICLO 1

3. Atividades da equivalência obrigatória

#	Atividade	Situação	Resultado esperado
0	Levantamento do ambiente, reunião, análise inicial das APIs, documentação e planejamento	Concluído	Base técnica e operacional consolidada
1	Fechamento da Etapa 0: contratos, campos, CIT/MIT, providers, portabilidade, correlação e idempotência	Em andamento; depende de respostas externas	Decisões e contratos técnicos formalizados
2	Solução Dataverse	Planejado	Campos e componentes mínimos disponíveis
3	Fundação da Function central	Planejado	Camada central preparada por ambiente
4	Adapter Gateway	Planejado	Operações de cobrança e consulta integradas
5	Adapter Cartão Protegido	Planejado	Tokenização e exclusão de cartão integradas
6	Contratos, adapters e roteamento	Planejado	Seleção controlada entre MaxiPago e Braspag
7	Plug-ins e Custom Workflow Activities	Planejado	Chamadores do Dynamics adequados à camada central
8	Estados e workflows	Planejado	Retornos convertidos para os estados internos atuais
9	Portabilidade e vinculação	Planejado	Tokens portados vinculados aos cartões corretos
10	Caminhos de cobrança	Planejado	Cobrança individual, automática e lote manual preservados
11	Estorno total	Planejado	Estorno total disponível pelo Dynamics
12	Resiliência, segurança e observabilidade	Planejado	Retentativas seguras, rastreabilidade e proteção contra duplicidade
13	Testes técnicos	Planejado	Cenários técnicos e regressões comprovados
14	Pacotes e implantação	Planejado	Componentes organizados para DEV, HML e PROD
15	Correções e apoio técnico	Planejado	Ajustes da implementação e suporte ao corte
16	Documentação final	Planejado	Operação, monitoramento e rollback documentados

Idempotência é a proteção contra cobrança ou estorno duplicado. Se a mesma tentativa for reenviada por timeout ou falha de comunicação, o sistema deve reconhecer que se trata da mesma operação, consultar o resultado existente e impedir um segundo efeito financeiro. A chave de idempotência permanece igual nos retries da mesma tentativa; o identificador de correlação serve para rastrear cada chamada técnica.

CICLO 1

4. Etapa final condicionada — tokenização por bandeira

Atividade	Conteúdo	Condição
Habilitação e desenho	Validar produto contratado, elegibilidade de tokens portados, bandeiras/providers e identificadores CIT/MIT	Contrato e habilitação confirmados
Implementação	Adequar requests, respostas, persistência e vínculo dos identificadores necessários	Não comprometer a equivalência básica
Testes técnicos	Visa, Mastercard e Elo; primeira e subsequente; providers aplicáveis; falhas e fallback definido	Recursos disponíveis no sandbox
Documentação e correções	Registrar evidências, ajustes e atualizar o runbook	Conclusão dos testes técnicos

Essa etapa será executada no Ciclo 1 somente se as habilitações e informações necessárias estiverem disponíveis sem comprometer a entrega básica de 15/10. Caso contrário, será tratada em janela posterior.

CICLO 1

5. O que está dentro do escopo

- De/Para técnico das sete operações MaxiPago para Gateway/Cartão Protegido.
- Nova camada Azure Function central e neutra.
- Adapter MaxiPago para convivência e adapter Braspag para a nova operação.
- Tokenização/destokenização lógica pelo Cartão Protegido.
- Cobrança tokenizada com Cielo30 e Rede2.
- Card On File, classificação CIT/MIT necessária ao processo atual e identificadores devolvidos.
- Consulta/reconciliação de resultado incerto e prevenção de dupla cobrança.
- Estorno total.
- Quatro campos neutros e alterações mínimas em plug-ins, CWAs e workflows.
- Manutenção dos três caminhos de cobrança existentes.
- Manutenção da seleção manual orientada pela tabela externa do Thales, sem importar, automatizar ou recriar essa tabela no Dynamics/BC.
- Preservação da jornada assistida no Dynamics para doações originadas por telefone, WhatsApp e outros canais, desde o cadastro/tokenização do cartão até a cobrança da fatura existente.
- Tratamento distinto de primeira utilização e utilização subsequente do cartão para as jornadas Site, Dynamics e token portado.
- Ferramenta/rotina para aplicar o De/Para de tokens fornecido pela portabilidade.
- Testes técnicos do desenvolvimento.
- Pacotes e apoio de implantação em DEV, HML e PROD.
- Correções de defeitos do que foi implementado.
- Telemetria, segurança básica da integração, runbook e rollback.
- Tokenização por bandeira apenas como etapa condicionada, sem bloquear a equivalência básica.
- Orientação técnica, sem desenvolvimento, para o primeiro pagamento com cartão de crédito no site.

CICLO 1

6. O que não está dentro do escopo

- Execução da homologação funcional/UAT pela AlfaPeople.
- Elaboração e execução de todos os casos de negócio do cliente.
- Alterações no site, front-end, checkout ou backend que hoje atende o site.
- Criação ou redesenho funcional dos processos que geram oportunidade, contrato, linha e primeira fatura para os canais assistidos; será preservado o processo existente que a ChildFund confirmar.
- Contratação, negociação comercial ou habilitação feita pela Braspag/Cielo.
- Execução da portabilidade dentro dos ambientes dos provedores.
- Obtenção de PAN/CVV ou saneamento manual de cartões sem correlação fornecida.
- Service Bus, filas, processamento assíncrono ou redesenho do lote.
- Alteração do limite operacional de 75 faturas.
- Nova agenda de recorrência no Gateway.
- Desenvolvimento, importação ou manutenção sistêmica da tabela externa de datas utilizada pelo Thales.
- Mudança do processo de geração de faturas no BC/Dynamics.
- Refatoração ampla de todos os campos, workflows e nomes que contêm maxipago.
- Remoção da solução/código MaxiPago durante a janela de convivência.
- Estorno parcial ou múltiplos estornos.
- Antifraude, 3DS ou produtos não contratados para cobranças com cartão de crédito.
- Alterações no processo de débito em conta, nos campos bancários do cadastro ou em suas integrações, pois esse processo não utiliza a MaxiPago.
- Reconciliação financeira/contábil nova, chargeback, conciliação por arquivo ou portal operacional novo.
- Melhorias gerais de BC, DFC, CE/CXP ou outros processos posteriores.
- Correção de dados históricos não causada pela implantação.
- Custos Azure, taxas de adquirente, licenças ou consumo da Braspag/Cielo.
- Períodos de espera por acesso, credencial, contrato, retorno de fornecedor ou decisão da ChildFund.

Qualquer item acima pode ser tratado por change request ou ciclo posterior.

CICLO 1

7. Responsabilidades

AlfaPeople

- Desenvolver, configurar e documentar os componentes descritos.
- Executar testes técnicos e entregar evidências.
- Preparar os pacotes e apoiar tecnicamente as implantações.
- Corrigir defeitos vinculados à implementação.
- Informar imediatamente bloqueios de contrato, credencial ou comportamento não documentado.

ChildFund

- Disponibilizar acessos, decisões de negócio e responsáveis por ambiente.
- Coordenar Braspag/Cielo, banco/adquirentes e time do site.
- Fornecer credenciais e habilitações nos três ambientes.
- Validar a regra de escolha da adquirente e os efeitos posteriores no negócio.
- Executar e aprovar a homologação funcional.
- Definir piloto, aceite, corte, plano B e decisão de rollback.

Braspag/Cielo

- Confirmar produtos e providers contratados.
- Disponibilizar credenciais/sandbox e suporte técnico.
- Executar/assistir a portabilidade e fornecer De/Para inequívoco dos tokens.
- Confirmar CardToken nos dois providers, Card On File, CIT/MIT e tokenização por bandeira para cartão de crédito.

Time responsável pelo site

- Implementar o primeiro pagamento no backend seguro.
- Entregar ao Dynamics somente token e metadados não sensíveis definidos no contrato.
- Implementar e validar o primeiro pagamento com cartão de crédito conforme o contrato definido.

CICLO 1

8. Dependências e risco de prazo

A execução está prevista de 14/09/2026 a 15/10/2026. O prazo depende da disponibilidade dos ambientes, das credenciais, das habilitações da Braspag/Cielo e do arquivo de portabilidade. Atividades independentes deverão avançar em paralelo para preservar a data de corte. Assim:

1. Credenciais, habilitações e formato da portabilidade são itens de caminho crítico.
2. A equivalência básica deve ser priorizada antes da tokenização por bandeira.
3. O cronograma exige paralelismo entre as frentes técnicas e priorização formal da equivalência básica.
4. A ChildFund precisa manter um plano B caso a portabilidade não chegue em tempo útil.
5. Nenhum timeout pode acionar fallback automático para outro provedor.
6. A data de piloto deve preservar tempo para correção antes de 15/10/2026.

CICLO 1

9. Entregáveis

- Código-fonte da Function central e adapters.
- Alterações versionadas em plug-ins/CWAs.
- Solução Dataverse com campos e componentes mínimos.
- Configuração por ambiente sem segredos no repositório.
- Rotina de vinculação dos tokens portados.
- Evidências de testes técnicos.
- Matriz final de estados/códigos e campos.
- Runbook de implantação, monitoramento e rollback.
- Documentação de API interna e atualização da documentação dev.

CICLO 1

10. Adendo de integração do site

Para o primeiro pagamento com **cartão de crédito**, o endpoint recomendado continua sendo o Gateway POST /v2/sales/, chamado por um backend seguro, conforme descrito na documentação dev. A implementação do site é responsabilidade da parte contratada para desenvolvimento e sustentação do site.

Débito não deve ser implementado como Payment.Type = DebitCard: a ChildFund confirmou que se trata de **débito em conta**, registrado nos campos bancários do cadastro do doador, sem relação com a MaxiPago. Esse processo permanece fora do De/Para e do desenvolvimento deste Ciclo 1.

PLANEJAMENTO

Cronograma executivo

Janela estimada de 14/09 a 15/10/2026

Leitura do prazo

A execução está prevista para começar em 14/09/2026 e concluir em 15/10/2026. Para preservar essa data, atividades independentes avançam em paralelo e as dependências externas precisam ser disponibilizadas conforme o cronograma.

Fase	Janela estimada	Marco
Fechamento técnico e preparação	14–16/set	Decisões essenciais e contratos técnicos consolidados
Dataverse e fundação da Function	17–21/set	Campos mínimos e camada central preparados
Gateway, Cartão Protegido e roteamento	21–25/set	Adapters e convivência entre provedores implementados
Dynamics, estados, tokens e cobranças	24/set–02/out	Caminhos de cobrança e estorno integrados
Portabilidade e vinculação	28/set–07/out	Tokens recebidos, correlacionados e validados
Resiliência, testes técnicos e regressão	05–09/out	Cenários técnicos comprovados
Pacotes, correções e documentação	08–13/out	Entrega preparada para implantação
Validação pré-corte	14/out	Checklist técnico e decisão de continuidade
Entrega planejada	15/out	Pacote final e apoio técnico ao corte

- A homologação funcional da ChildFund deve ocorrer em paralelo, por entregas incrementais.
- Credenciais, sandbox, providers e portabilidade são dependências de caminho crítico.
- A tokenização por bandeira permanece condicionada e não deve bloquear a equivalência básica.

CRONOGRAMA EM CALENDÁRIO

Setembro de 2026

Janela estimada de execução de 14/09 a 15/10/2026

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14 Planejamento e fechamento	15 Planejamento e fechamento	16 Planejamento e fechamento	17 Dataverse e Function	18 Dataverse e Function	19	20
21 Gateway e Cartão Protegido	22 Gateway e Cartão Protegido	23 Gateway e Cartão Protegido	24 Roteamento e Dynamics	25 Roteamento e Dynamics	26	27
28 Dynamics e tokens	29 Dynamics e tokens	30 Dynamics e tokens	1	2	3	4

Cor	Uso
Vermelho claro	Construção e integração
Azul claro	Testes técnicos e preparação da implantação
Amarelo claro	Validação pré-corte
Verde claro	Entrega planejada e corte

CRONOGRAMA EM CALENDÁRIO

Outubro de 2026

Janela estimada de execução de 14/09 a 15/10/2026

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
28	29	30	1 Cobranças e estorno	2 Cobranças e estorno	3	4
5 Resiliência e testes	6 Resiliência e testes	7 Resiliência e testes	8 Testes e correções	9 Testes e correções	10	11
12	13 Pacotes e documentação	14 Validação pré-corte	15 Entrega planejada	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Cor	Uso
Vermelho claro	Construção e integração
Azul claro	Testes técnicos e preparação da implantação
Amarelo claro	Validação pré-corte
Verde claro	Entrega planejada e corte

Data de corte

15/10/2026 é o marco informado para descontinuação da MaxiPago e a data prevista para conclusão da entrega. A execução do corte depende do aceite técnico, da homologação da ChildFund e da disponibilidade dos tokens portados.
